

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras						
							F	mes 1 P	M	F	mes 2 P	M
1		<b>URBANIZACION LOMAS DE CAUJARAL</b>	164 días	jue 10/12/15	mar 26/07/16							
2		<b>PRELIMINARES</b>	24 días	jue 10/12/15	mar 12/01/16							
3		Localizacion y Replanteo	24 días	jue 10/12/15	mar 12/01/16							
4		<b>EXPLANACIONES</b>	51 días	mié 13/01/16	mié 23/03/16							
5		Demolicion de Estructuras	16 días	mié 13/01/16	mié 03/02/16							
6		Excavacion y Corte a Maquina	35 días	jue 04/02/16	mié 23/03/16							
7		Transporte de Material	35 días	jue 04/02/16	mié 23/03/16							

Proyecto: PROGRAMACION LOMA Fecha: vie 11/12/15	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	mes 1				mes 2	
								F	P	M	F	P	M
8			<b>AFIRMADO BASE Y SUBBASE</b>	<b>25 días</b>	<b>vie 26/02/16</b>	<b>jue 31/03/16</b>							
9			Suministro Extendida y Compactacion de Subbase Granular Tipo INVIAS	22 días	vie 26/02/16	lun 28/03/16	6FF+3 días						
10			Suministro Extendida y Compactacion de Base Granular Tipo INVIAS	17 días	mié 09/03/16	jue 31/03/16	9FF+3 días						
11			<b>PAVIMENTO ASFALTICO</b>	<b>38 días</b>	<b>vie 01/04/16</b>	<b>mar 24/05/16</b>							
12			Imprimacion	8 días	vie 01/04/16	mar 12/04/16	10						
13			Concreto Asphaltico MDC-19	30 días	mié 13/04/16	mar 24/05/16	12						
14			<b>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>	<b>92 días</b>	<b>lun 21/03/16</b>	<b>mar 26/07/16</b>							

Proyecto: PROGRAMACION LOMA Fecha: vie 11/12/15	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			


Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	mes 1				mes 2	
								F	P	M	F	P	M
15			Excavaciones Varias sin Clasificar	3 días	lun 21/03/16	mié 23/03/16	6FF						
16			Transporte y Disposición de Material Sobrante	3 días	lun 21/03/16	mié 23/03/16	15FF						
17			Tubería de Desague de 10"	5 días	jue 24/03/16	mié 30/03/16	15						
18			Relleno para Estructuras	5 días	jue 24/03/16	mié 30/03/16	17FF						
19			Concreto Clase D (Cajas-Registro)	3 días	mié 25/05/16	vie 27/05/16	13						
20			Concreto Clase F (Solado)	1 día	mar 24/05/16	mar 24/05/16	19CC-1 día						
21			Cuneta de Concreto Fundida en el Lugar	45 días	mié 25/05/16	mar 26/07/16	13						

--


Proyecto: PROGRAMACION LOMA Fecha: vie 11/12/15	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	mes 1				mes 2	
								F	P	M	F	P	M
22			Acero de refuerzo FY=4200 kg/cm2	45 días	mié 25/05/16	mar 26/07/16							
23			Pedraplen con Piedra Ciclopea	14 días	jue 24/03/16	mar 12/04/16							


Proyecto: PROGRAMACION LOMA Fecha: vie 11/12/15	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

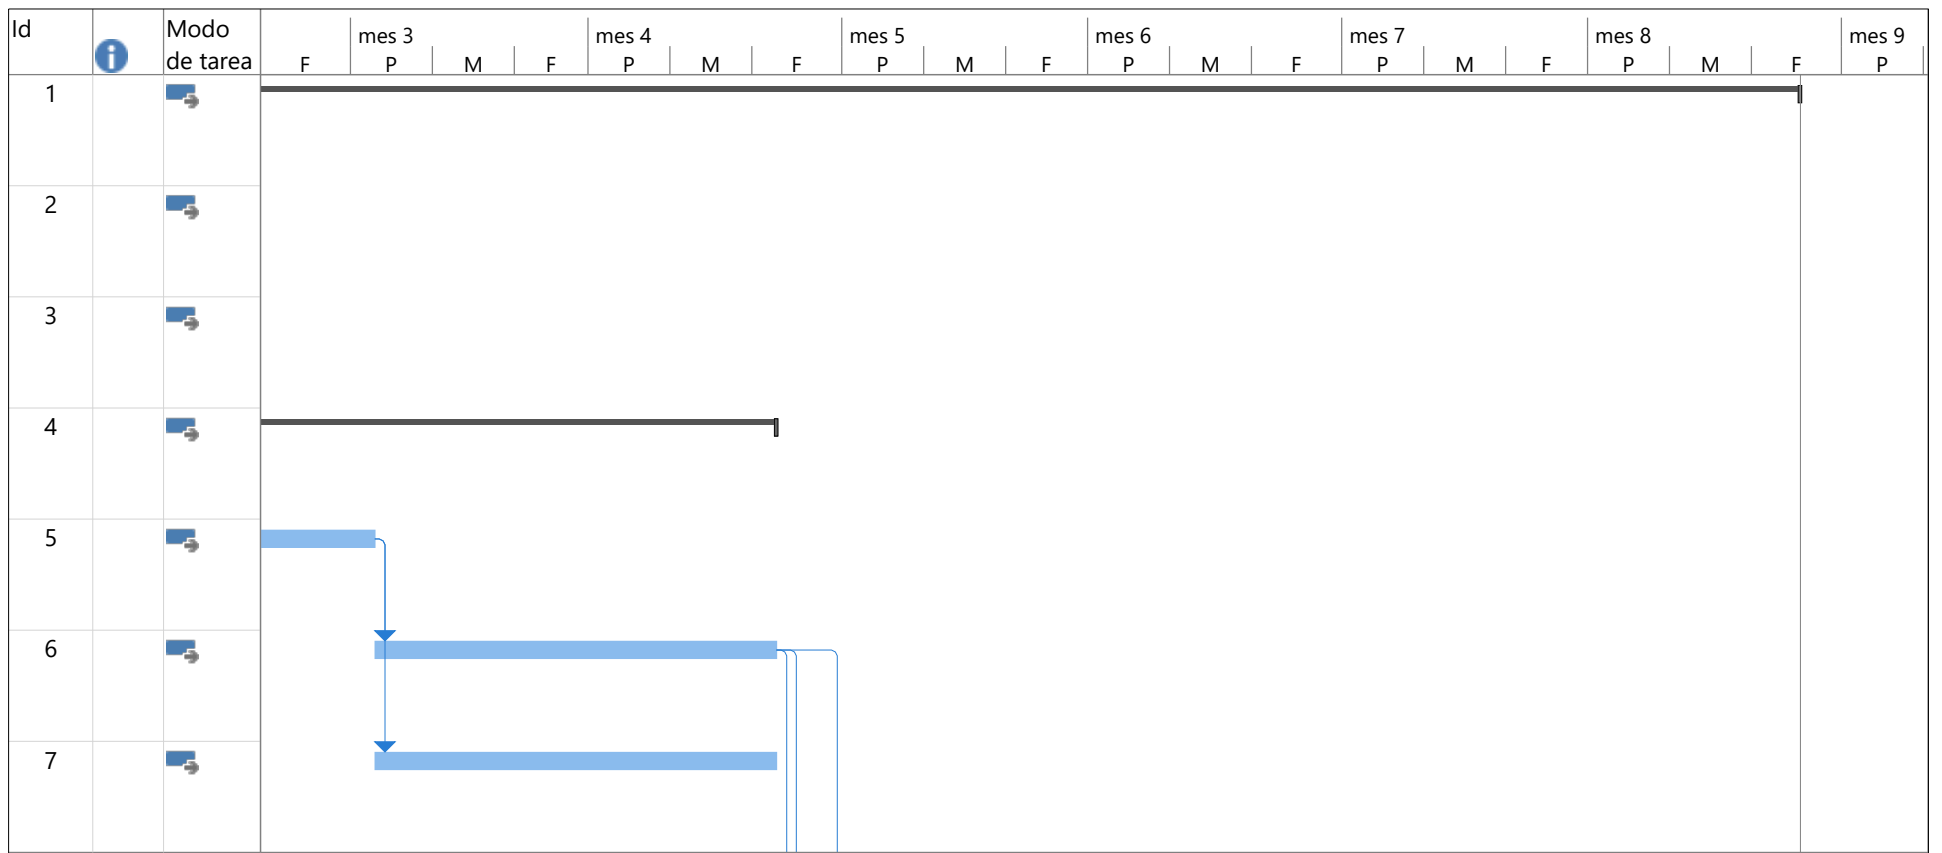

Proyecto: PROGRAMACION LOMA Fecha: vie 11/12/15	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

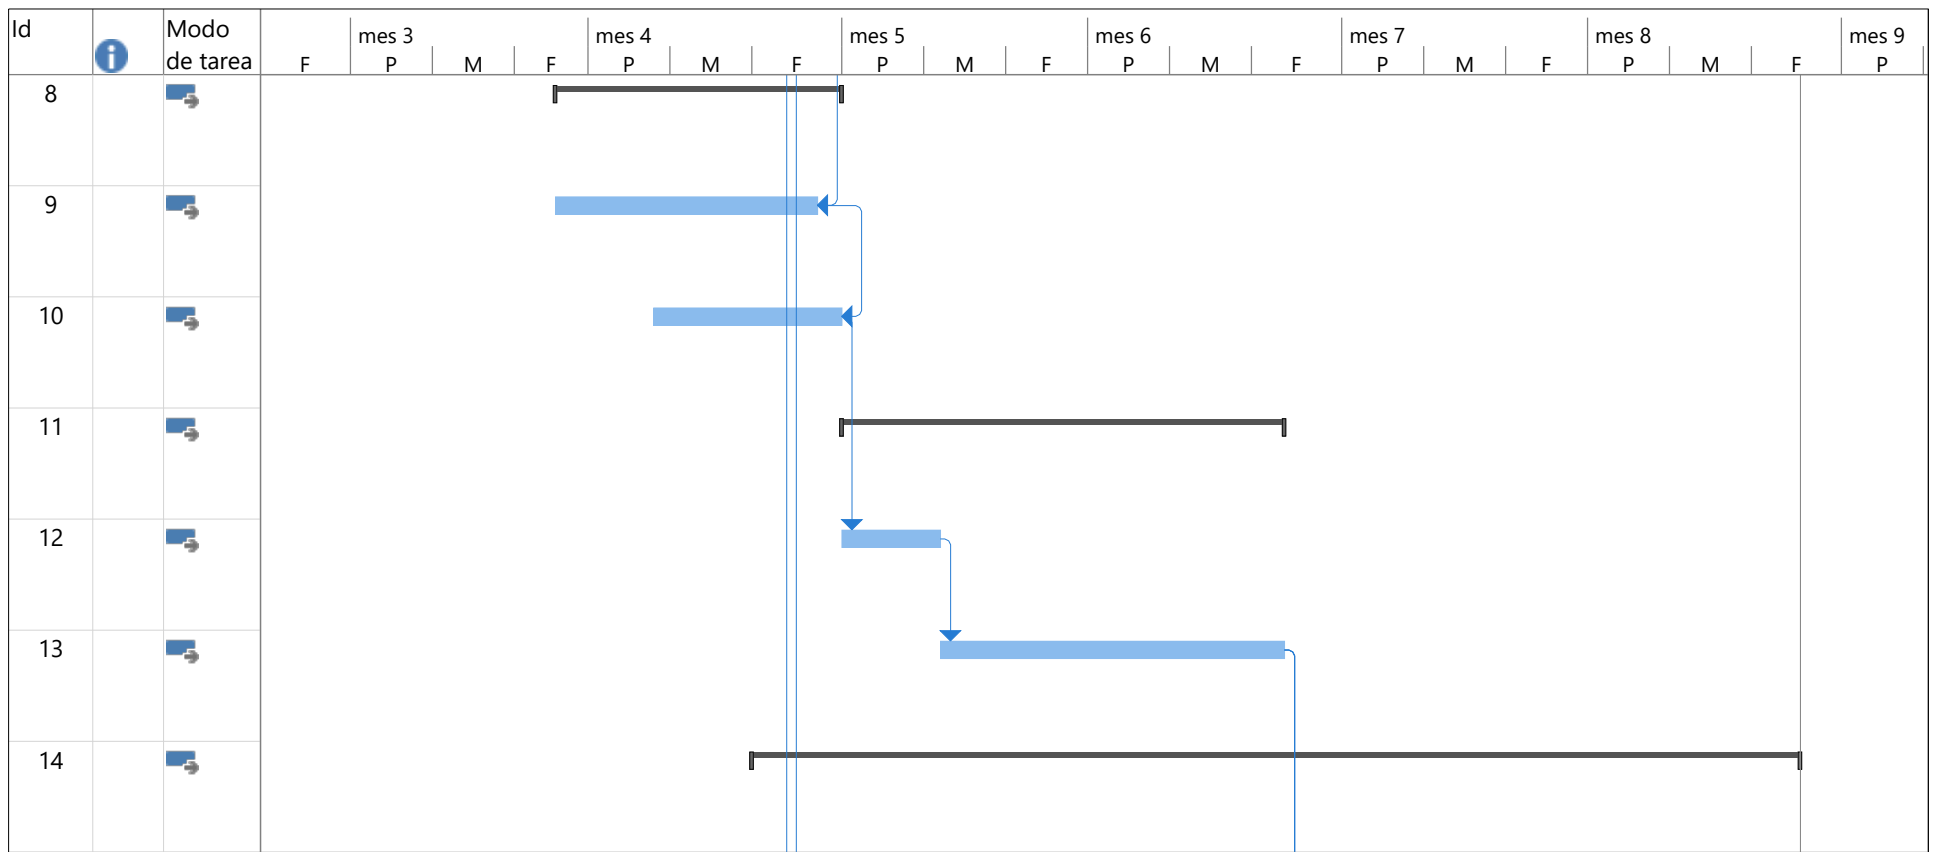

Proyecto: PROGRAMACION LOMA Fecha: vie 11/12/15	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

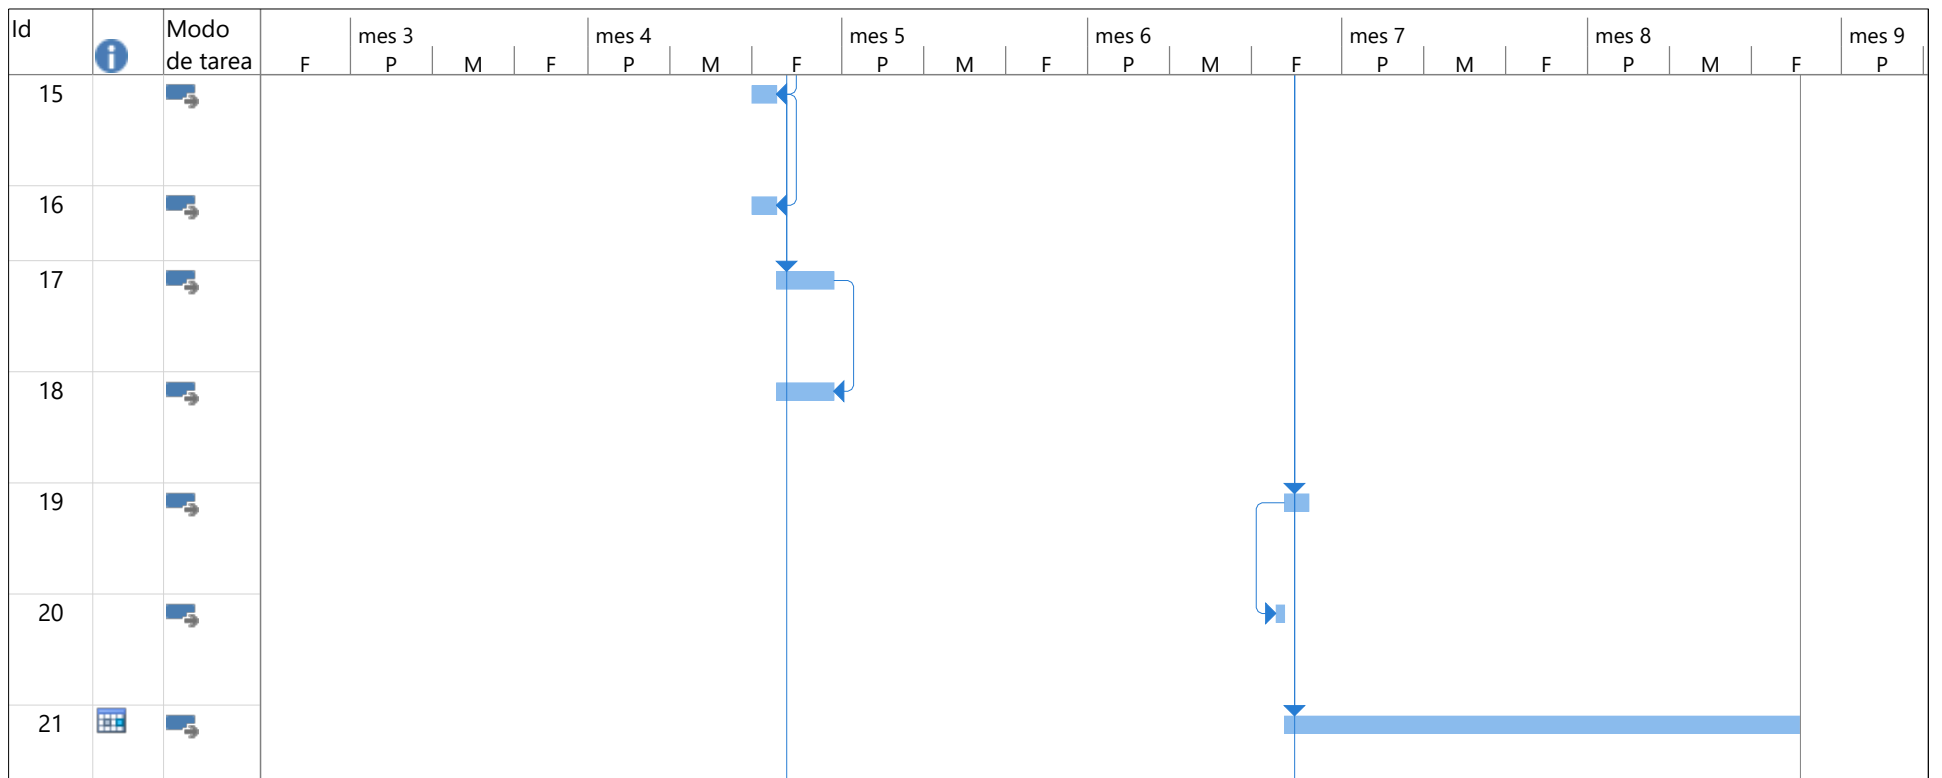

Proyecto: PROGRAMACION LOMA Fecha: vie 11/12/15	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Id	i	Modo de tarea	mes 3			mes 4			mes 5			mes 6			mes 7			mes 8			mes 9
			F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P		
22																					
23																					



Proyecto: PROGRAMACION LOMA Fecha: vie 11/12/15	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			
